


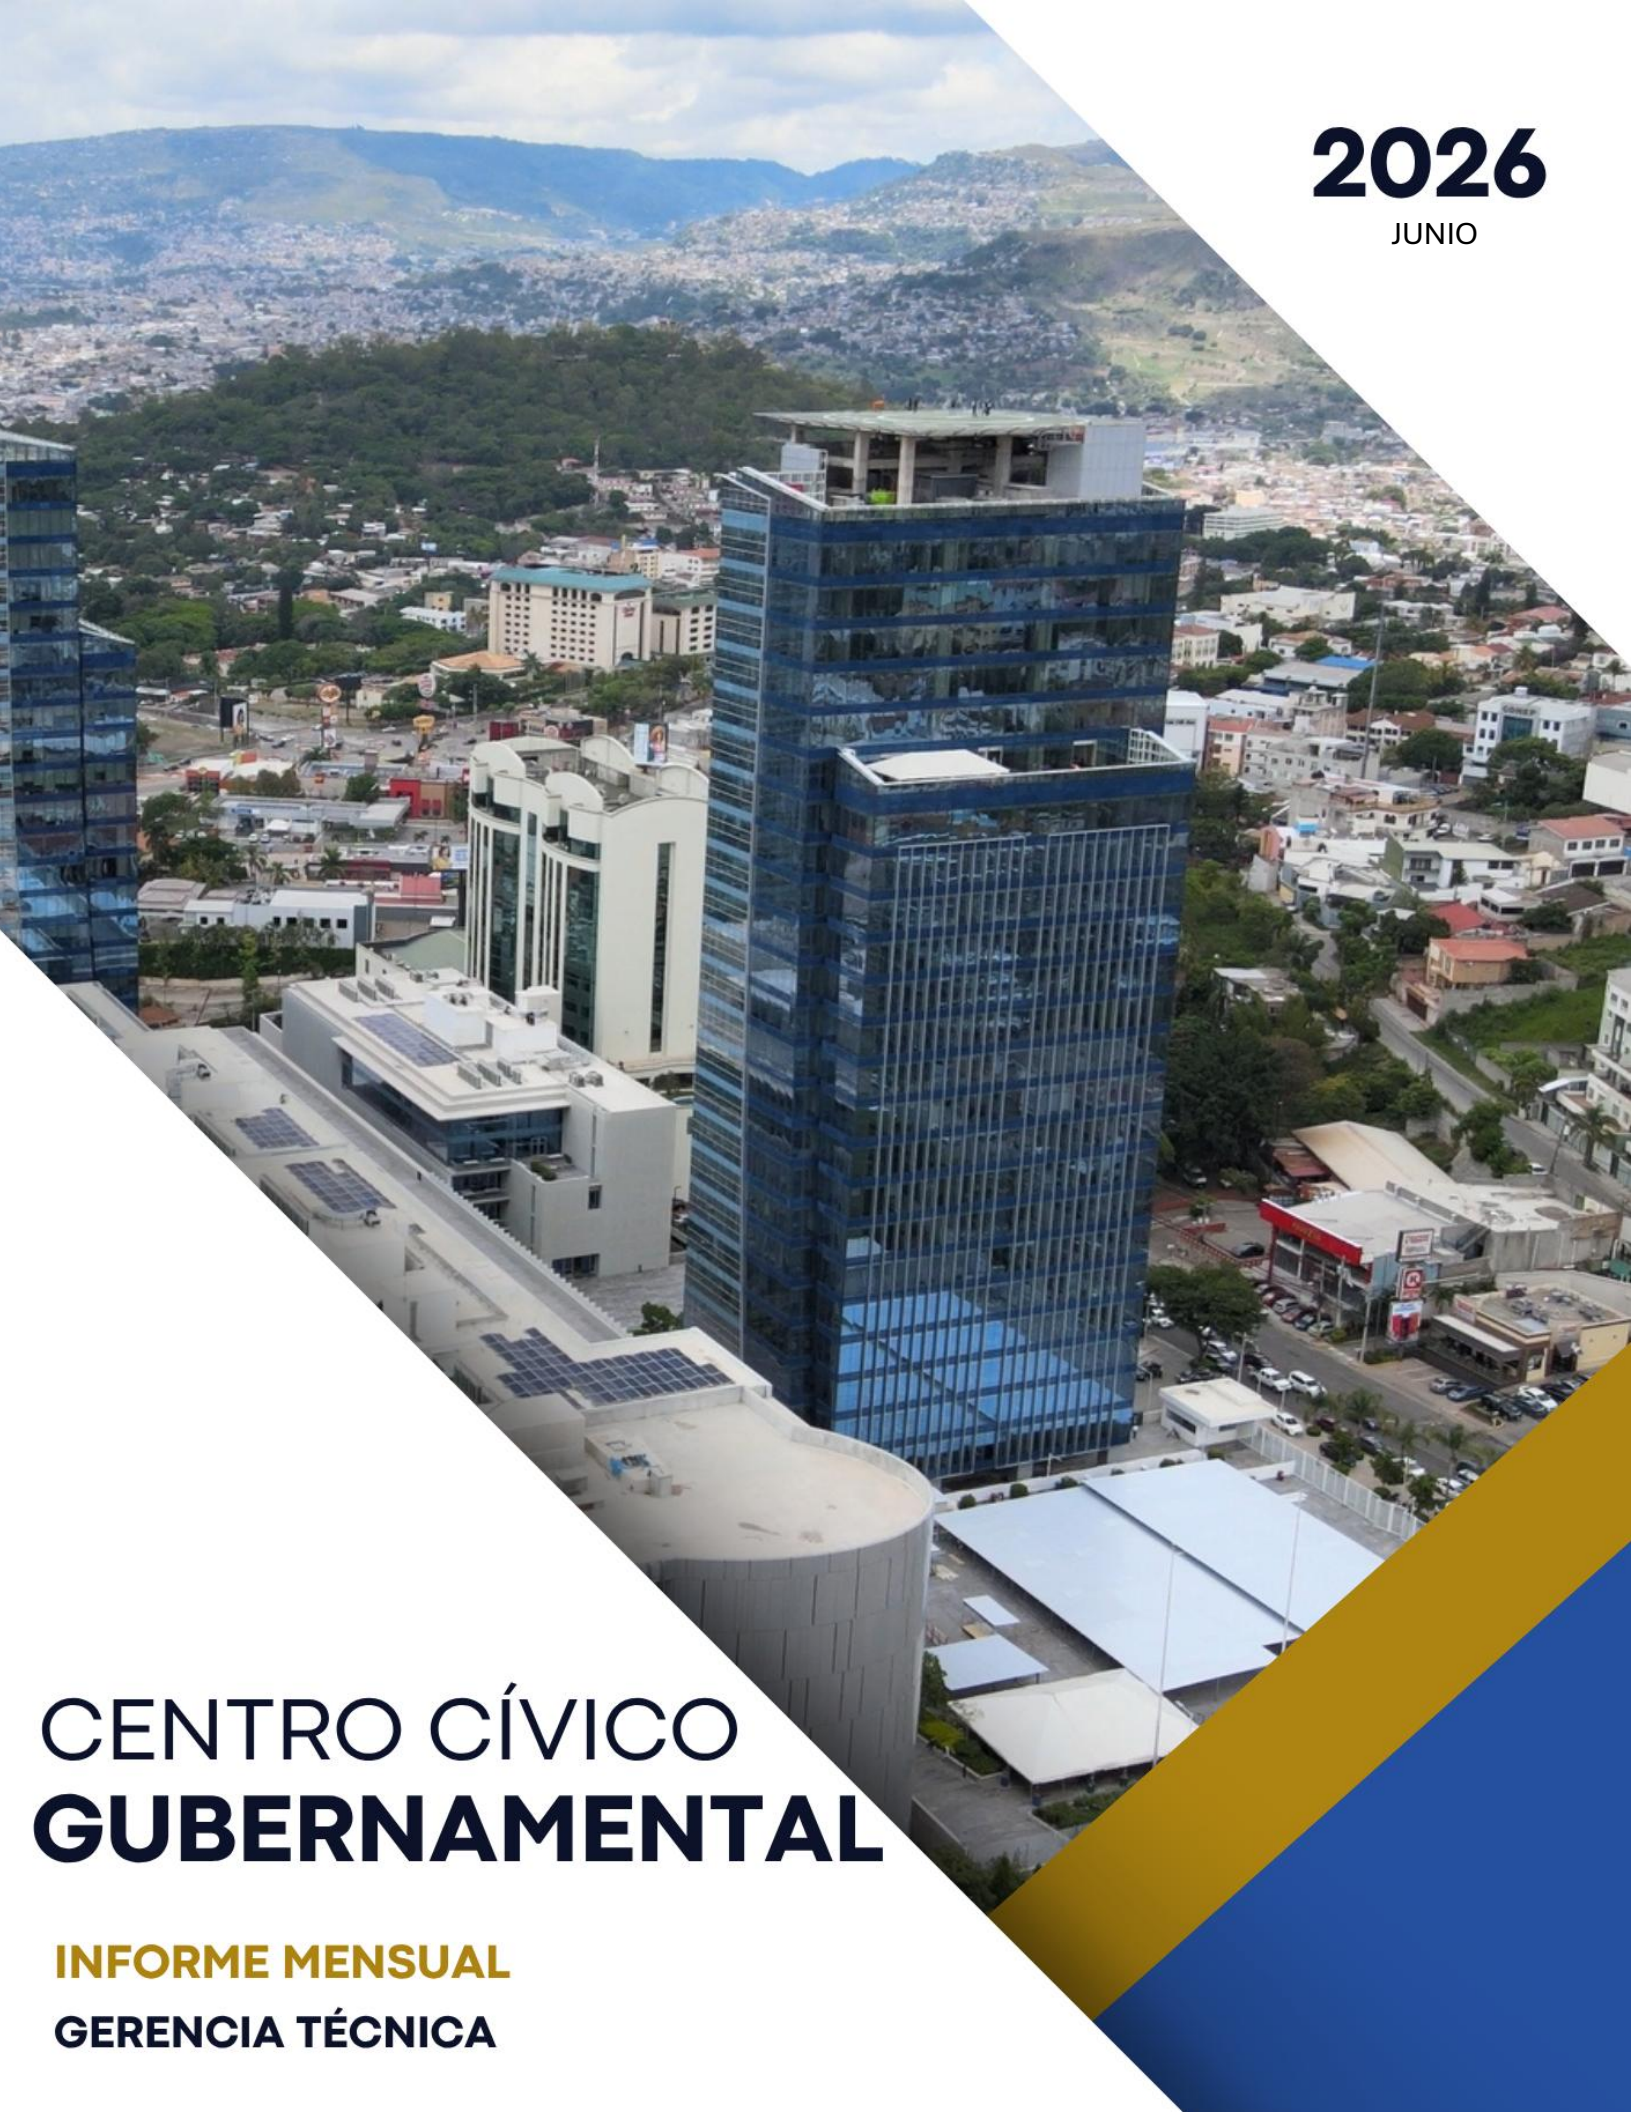

2026
JUNIO

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

INFORME MENSUAL
GERENCIA TÉCNICA

INFORME DE PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026
GERENCIA TÉCNICA

PERIODO DEL INFORME: Al 30 de junio de 2026

NOMBRE DEL PROYECTO: Contrato de Alianza Público Privada para la Prestación de los Servicios y el Diseño, Financiamiento, Demolición, Construcción, Equipamiento, Provisión del Mobiliario, Operación, Explotación y Mantenimiento de las Instalaciones, Relacionados con el Centro Cívico Gubernamental, en el municipio del Distrito Central de la Republica de Honduras.

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Predio denominado José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

CONCEDENTE: Secretaría de Finanzas (SEFIN)

CONCESIONARIO U OPERADOR: Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras. S.A. DE C.V. (DOIH)

EMPRESA SUPERVISORA: Consorcio TECNISA – CINSIA

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: 15 de agosto de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN: 15 de abril de 2044

PLAZO DE CONCESION: 27 años y 8 meses (según Addendum No. 1)

MONTO ESTIMADO DE INVERSION: US\$ 176.1 Millones

FECHA DE ACREDITACION DE CIERRE FINANCIERO: 22 de noviembre de 2017

No. DECRETO EJECUTIVO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO: PCM-062-2013. (Fecha firma 19 de diciembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial LA GACETA el 26 de diciembre de 2013)

No. DECRETO LEGISLATIVO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO: 307-2013, (Fecha firma 13 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial LA GACETA el 12 de mayo de 2014)

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Addendum No. 1 (Suscrito el 26 de octubre de 2018)

Addendum No. 2 (Suscrito el 25 de enero de 2019)

Addendum No. 3 (Suscrito el 15 de noviembre de 2019)

Addendum No. 4 (Suscrito el 08 de enero de 2021)

Addendum No. 5 (Suscrito el 24 de septiembre de 2021)

Addendum No.6 (Suscrito el 13 de marzo de 2024)

FIDUCIARIO: BANCO LAFISE

PLAZO CONTRATO DE FIDEICOMISO: 30 años

1. ETAPA DE INICIO

a. Proyecto Ejecutivo

A continuación, se presenta la información proporcionada por el Supervisor de Obras “Consortio TECNISA-CINSA”, correspondiente a la etapa de actividades previas del Proyecto. En esta etapa el Inversionista Operador Privado debe llevar a cabo todas las actividades, que permitan dar inicio a la Prestación de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales, en la Fecha Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios y que incluyen sin limitación el Diseño, Proyecto Ejecutivo, Financiamiento, Demolición, Construcción, Equipamiento, Provisión de Mobiliario y las Actividades de Preparación Operativa hasta concluir el CCG en los términos y condiciones establecidos en el Contrato.

Estatus de Proyecto Ejecutivo: 99.50% de avance global

El Proyecto Ejecutivo está compuesto por cinco (5) entregas progresivas del Complejo Centro Cívico Gubernamental, pactadas contractualmente en función del avance y grado de terminación requerido en cada uno de los niveles para este proyecto. El último avance global reportado por la Supervisión de Obras Consortio TECNISA-CINSA, en su informe mensual del mes de septiembre es de 99.50%.

Según el Informe mensual proporcionado por la Supervisión TECNISA-CINSA, el 15 de febrero de 2018 el Inversionista Operador Privado, DOIH, recibió de parte de la Contratante la aprobación del Proyecto Ejecutivo por unidades funcionales en obra Gris para los siguientes frentes constructivos: Torre 1, Torre 2, Cuerpo Bajo A y Cuerpo Bajo B.

Asimismo, el 22 de mayo de 2018 se aprobó el Proyecto Ejecutivo por unidad funcional completa en obra gris para el Cuerpo Bajo C.

b. Cierre Financiero

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Alianza Público- Privada, se firmó el Cierre Financiero del Proyecto Centro Cívico Gubernamental el 22 de noviembre de 2017. Contrato de Financiación relativo al Contrato de la referencia para la Financiación Institucional y Comercial Sindicada Multidivisa, por la cantidad de US\$ 155,318,080.00.

c. Ordenes de Inicio:

- Orden de Inicio para Torre 1, Torre 2, Cuerpos Bajos A y B emitida por la Contratante en fecha 15 de febrero de 2018
- Orden de Inicio para el Cuerpo Bajo C emitida por la Contratante en fecha 22 de mayo de 2018
- Orden de Inicio para el Cuerpo Bajo D emitida por la Contratante en fecha 25 de enero de 2019

d. Permiso de Construcción:

- Licencia de Obra 2017-4032 de fecha 06 de febrero de 2018
- Licencia de Obra 2016-6110 de fecha 30 de noviembre de 2016

e. Licencia ambiental:

- Licencia ambiental No. 001-2018 de fecha 12 de enero de 2018

f. Detalle de Estado de Avance por Obra

Certificación de Avance de Actividades Previas Integridad de Proyecto			
Actividad	% Composición de Obra	% Avance	% Completado
Proyecto Ejecutivo	1.48	99.90%	1.48%
Preliminares	1.22	100.00%	1.22%
Trabajos Previos referidos a la Construcción	2.42	100.00%	2.42%
Cimentación Profunda	4.06	100.00%	4.06%
Estacionamiento	15.61	99.65%	15.56%
Sótano 0		99.89%	
Sótano 1		99.60%	
Sótano 2		99.90%	
Sótano 3		99.38%	
Sótano 4		99.50%	
Torre 1	21.24	99.80%	21.20%
Torre 2	20.79	98.16%	20.41%
Cuerpo Bajo A	9.56	99.15%	9.48%
Cuerpo Bajo B	10.24	99.13%	10.15%
Cuerpo Bajo C	10.65	98.94%	10.54%
Obras Exteriores	2.45	99.80%	2.45%
Conservación de Actual Casa Presidencial	0.28	100.00%	0.28%
TOTAL	100.00		99.23%

“Fuente: Datos proporcionados por el Consorcio TECNISA-CINSA en el Informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2021- último informe generado por este para Predio A”.

2. ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRAS

g. Antecedentes:

Datos relevantes

- El Centro Cívico Gubernamental consta de dos plazas (Plaza La Democracia y Plaza de las nueve Etnias), dos torres de 24 y 25 niveles de altura, una de estas con Helipuerto, tres edificios bajos de 6 y 7 niveles de altura y cuatro sótanos y medio de estacionamientos
- La firma del Contrato entre las partes; Secretaría de Finanzas, COALIANZA y Banco LAFISE como miembros de La Contratante y el Inversionista Operador Privado (IOP), se llevó a cabo el 15 de agosto de 2016.
- El presupuesto referencial para la Construcción del proyecto es de US\$176,1 millones, según la propuesta económica del Inversionista Operador Privado.
- La Supervisión externa del proyecto fue adjudicada, al Consorcio TECNISA – CINSA, el Contrato de Supervisión se firmó entre el Consorcio TECNISA-CINSA y el Banco LAFISE, en su condición de Fiduciario del proyecto en fecha 20 de octubre del 2016 y la fecha de inicio de Contrato es el 12 de noviembre de 2016. El

presupuesto para la supervisión del proyecto es de US\$ 2.3 millones, según la propuesta económica del Consorcio de Supervisión.

- **Inicio de obras constructivas:**

De acuerdo con lo notificado por el Consorcio Supervisor, en fecha 05 de diciembre de 2016, se dio la autorización por parte de la Contratante y la AMDC para iniciar las excavaciones profundas para estudios de suelos en el proyecto.

- **Finalización de obras constructivas:**

La etapa constructiva para el “Predio A” concluyeron con la emisión del Permiso Provisional para el Inicio de la Prestación parcial de los Servicios de la Unidad Funcional Torre 1, emitido el 27 de septiembre de 2021.

Actualmente el 100% del Centro Cívico Gubernamental se encuentra en su etapa de operación y mantenimiento, a excepción del Cuerpo Bajo D que ha sido considerada una Obra Adicional, misma que se encuentra en etapa de construcción con un porcentaje de avance físico de 58.09% y avance financiero invertido de US\$.15,599,893.31 al 30 de enero de 2025.

h. Actividades de construcción del periodo (Cuerpo Bajo D)

Ninguna

i. Cronograma de ejecución de obra (Cuerpo Bajo D)

De conformidad a lo establecido en el Addendum No. 6, Cláusula Quinta “Programa de Construcción de la Obra Adicional Cuerpo Bajo D y mejoras en las Instalaciones del Centro Cívico Gubernamental”, el cronograma para ejecución de dicha obra es el siguiente:

Plazo	Hito
10 días después de la presentación de Garantía de Cumplimiento de Contrato	Entrega del Anticipo de Obra Adicional Cuerpo Bajo D y Mejoras en Instalaciones del Centro Cívico Gubernamental.
A más tardar 120 días después de la firma de adendum 06 de la readecuación de la Obra Adicional Cuerpo Bajo D y Mejoras en Instalaciones del Centro Cívico Gubernamental.	Terminación del cien por ciento (100%) de avance de obra niveles Planta baja 1 y 2 y nivel 7 del Cuerpo Bajo D y Mejoras en Instalaciones del Centro Cívico Gubernamental.
A más tardar 180 días después de la firma de adendum 06 de la readecuación de la Obra Adicional Cuerpo Bajo D y Mejoras en Instalaciones del Centro Cívico Gubernamental.	Terminación del sesenta y cinco por ciento (65%) de avance de obra del resto de los Plantas del Cuerpo Bajo D y Mejoras en Instalaciones del Centro Cívico Gubernamental.
270 días después de la firma del adendum 06 de la readecuación de la Obra Adicional Cuerpo Bajo D y Mejoras en Instalaciones del Centro Cívico Gubernamental.	Terminación del cien por ciento (100%) de avance de obra del resto de los Plantas del Cuerpo Bajo D y Mejoras en Instalaciones del Centro Cívico Gubernamental.

Fuente: Addendum No.06 de Ampliación de Contrato APP

j. Avance de Ejecución Física

Predio A del CCG:


En el último informe proporcionado por el Supervisor de Obras “Consortio TECNISA-CINSA”, al 30 de septiembre de 2021 se registra una ejecución física, calculada por la supervisión de 100%. Por lo que, en fecha 11 de agosto de 2023, la Superintendencia realizó requerimiento de información a dicho Supervisor, cuya respuesta se encuentra en el Oficio SUP-CCG-G-010-2023 de fecha 21 de agosto de 2023, en la que señala que, *“para efectos de operatividad y seguridad del complejo al 30 de septiembre de 2021 el proyecto había alcanzado un avance de 99.23% (llamado por la supervisión como “avance integral de proyecto”, este término no existe en contrato), con base a lo anterior, la Supervisión declaró alcanzado el Hito 100% de la etapa de construcción.”*

Además, indica de forma textual que *“... se detectaron numerosos faltantes menores, muchos de ellos meramente cosméticos, que fueron reportados y mapeados por esta Supervisión. Estos faltantes, aunque muy numerosos, tienen un peso muy bajo en relación con la magnitud del proyecto, menos del 1%, lo cual se refleja en el avance Integridad del proyecto.”*

Asimismo, según información proporcionada por el Representante Designado de la Contratante mediante Oficio RDC-PCCG-0609-2023 de fecha 22 de agosto de 2023, basada en los registros del Supervisor de Obras Consortio TECNISA-CINSA en “Informe de faltantes menores del Predio A” con corte al mes de agosto de 2023, el estatus de dichos faltantes es el siguiente:

- 8,626 faltantes menores revisados por el Supervisor en compañía del IOP
- 2,488 faltantes menores pendientes de atender por parte del IOP y,
- 240 faltantes menores registrados en los permisos correspondientes, con categorías “Helipuerto, Operativo, recomendación, restricción, repetido y N/A”.

Por lo que, es opinión de esta Gerencia que el porcentaje de avance físico del proyecto no puede ser de un 100% hasta que los faltantes menores sean atendidos por el Inversionista Operador Privado y verificados por el Supervisor de Obras. La Superintendencia está dando seguimiento a este asunto.

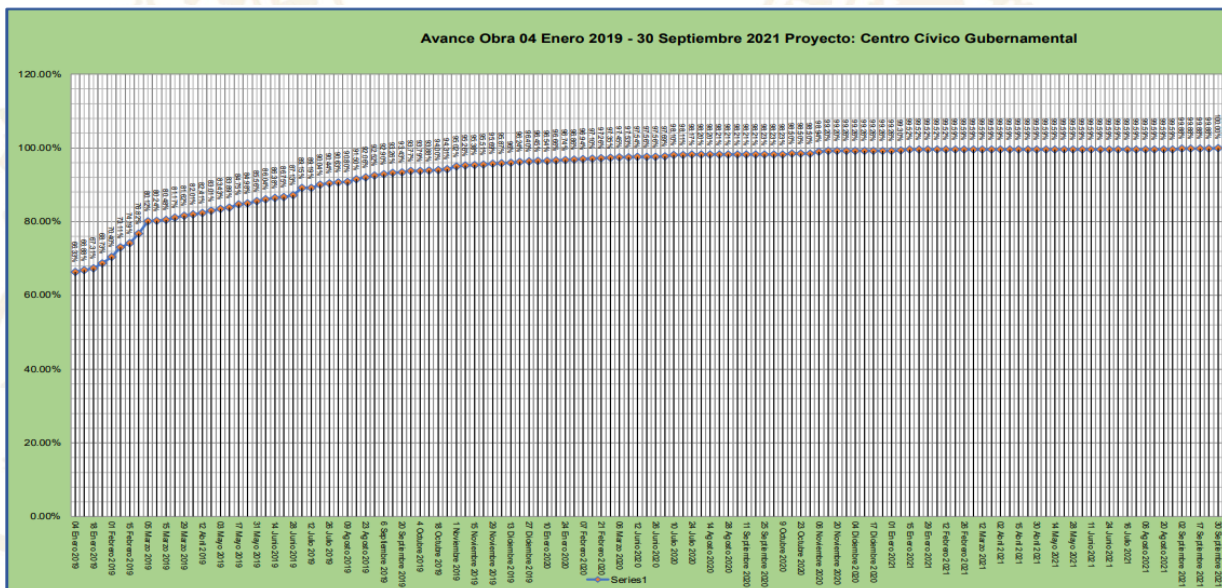

Fuente: Avance de obras de Informe mensual del Consortio TECNISA-CINSA-septiembre 2021. Último informe generado por este.

Avance de Obras (Cuerpo Bajo D):


Mediante oficio SUP-CCG-CBD-004-2025, el Supervisor de Obras, Consorcio TECNISA-CINSA hizo entrega del Informe mensual del Cuerpo Bajo D, informando que por solicitud de la Contratante suspendió los servicios de supervisión a partir del 13 de enero de 2025.

Por lo que, el Avance Físico del Cuerpo Bajo D registrado por el Consorcio Supervisor TECNISA – CINSA al 13 de enero de 2025 es de **58.09%**, asimismo registra un **6.94%** por concepto de materiales almacenados, lo que suma un total de **65.03%** registrado como Avance de Proyecto.

k. Avance de Ejecución Financiera

Predio A del CCG:

Según el Informe mensual de Supervisión proporcionado por el Consorcio Supervisor TECNISA – CINSA, con cierre al 30 de septiembre de 2021, el Avance Financiero (Invertido) es de **US\$ 176,028,960.18**

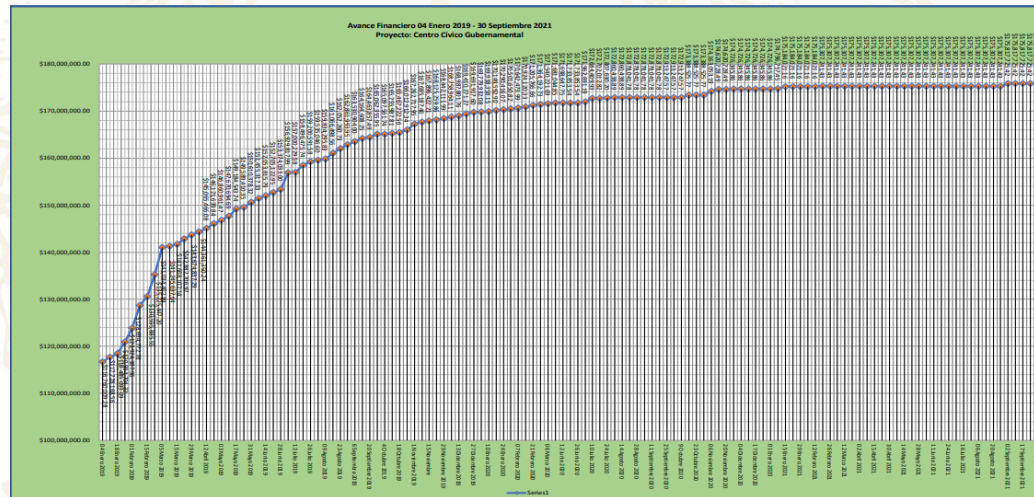

Fuente: Avance financiero de Informe mensual del Consorcio TECNISA-CINSA-septiembre 2021. Último informe generado por este.

Avance de Ejecución Financiera (Cuerpo Bajo D):

De acuerdo con el Informe proporcionado por el Consorcio Supervisor TECNISA – CINSA, con cierre al 13 de enero de 2025, el Avance Financiero del Cuerpo Bajo D es de **US\$15,599,893.31** (según dicho informe este valor incluye avance físico y materiales almacenados).

Nota: este tema está siendo analizado por la Gerencia Legal.

l. Resumen de estatus actual de la Concesión

El Centro Cívico Gubernamental actualmente se encuentra dentro la etapa de Prestación de los Servicios (Operación y mantenimiento), a excepción del Cuerpo Bajo D, el cual se encuentra en etapa de construcción, llamada contractualmente “Actividades Previas”.

INSTITUCIONES ALOJADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL:

TORRE 1:

- Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
- Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS)
- Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)
- Dirección General de Servicio Civil (DGSC)
- Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)
- Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC)
- Secretaría de Desarrollo Económico (SDE)
- Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS)
- Secretaría de Educación (SEP)
- Comisión Internacional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT)
- Secretaría de Estado de la Presidencia (SEP)
- Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa- Secretaría de Salud (UAFCE)
- Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)
- Secretaría de Prensa de Honduras (SPH)
- Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)
- Periódico Poder Popular
- Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP)
- Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)
- Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)
- Salas de Reuniones

TORRE 2:

- Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
- Unidad Técnica del Concedente del Proyecto Centro Cívico Gubernamental SEFIN/UCCG.
- Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SEGOB)
- Instituto Hondureño de Turismo (IHT)
- Empresa Nacional Portuaria (ENP)
- Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
- Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE)
- Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER)
- Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA)
- Secretaría de Seguridad Nacional (SSN)
- Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP).
- Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)
- Comisión Nacional Supervisora de los Servicios Públicos (CNSSP)/ Temporal Asesoría Legal, Radio Nacional de Honduras

CUERPO BAJO A:

- Servicio de Administración de Rentas (SAR).

CUERPO BAJO B:

- Instituto de la Propiedad (IP)
- Secretaría de Educación (SEDUC)
- Secretaría de Finanzas (SEFIN)- Temporal Comisionado Presidencial para derogación de ZEDES
- Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS)

CUERPO BAJO C:

- Instituto de la Propiedad (IP)
- Instituto Nacional de Migración (INM)
- Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
- Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP)

m. Fuerza laboral actual

- Esta gran Obra ha generado más de 18,000 empleos entre directos e indirectos, durante toda su etapa de construcción.

3. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

n. Detalle de Servicios brindados por el Concesionario

El IOP es el encargado de prestar los Siguientes Servicios:

- Servicios Obligatorios Comerciales
- Servicios Obligatorios No Comerciales
- Servicios Opcionales

o. Emisión de Permisos Provisionales para el Inicio de la Prestación de los Servicios de las Unidades Funcionales del CCG emitidos por el Concedente:

Unidad Funcional Autónoma	Fecha de emisión de permiso provisional	Documento recibido
Torre 2/ Data Center	18 de febrero de 2020	Oficio RDC-PCCG-051-2020
Cuerpo Bajo A	01 de diciembre de 2020	Oficio RDC-PCCG-386-2020
Cuerpo Bajo B	19 de enero de 2021	Oficio RDC-PCCG-027-2021
Cuerpo Bajo C	05 de mayo de 2021	Oficio RDC-PCCG-237-2021
Torre 1	27 de septiembre de 2021	Oficio RDC-PCCG-557-2021



p. Detalle de Contraprestación

PORCENTAJE DE CONTRAPRESTACIÓN POR UNIDAD FUNCIONAL AUTONOMA:

TORRE 1:



Tabla 2 Porcentaje de Unidad Funcional Autónoma T1

Disociación	Porcentaje
Área Construida	13.51%
Estacionamiento	10.10%
Plaza	1.63%
Estacionamiento Sin cobro	2.44%
Total	27.68%

TORRE 2:



Tabla 3 Porcentaje de Unidad Funcional Autónoma T2

Disociación	Porcentaje
Área Construida	14.59%
Estacionamiento	10.92%
Plaza	1.76%
Estacionamiento Sin cobro	2.49%
Total	29.76%

CUERPO BAJO A:



Tabla 4 Porcentaje de Unidad Funcional Autónoma CBA

Disociación	Porcentaje
Área Construida	5.14%
Estacionamiento	3.85%
Plaza	0.62%
Estacionamiento Sin cobro	0.88%
Total	10.49%



CUERPO BAJO B:



Tabla 5 Porcentaje de Unidad funcional Autónoma CBB

Disociación	Porcentaje
Área Construida	7.83%
Estacionamiento	5.85%
Plaza	0.95%
Estacionamiento Sin cobro	1.33%
Total	15.96%

CUERPO BAJO C:



Tabla 6 Porcentaje de Unidad funcional Autónoma CBC

Disociación	Porcentaje
Área Construida	7.90%
Estacionamiento	5.92%
Plaza	0.95%
Estacionamiento Sin cobro	1.35%
Total	16.12%

q. Información relevante de la Etapa de Prestación de los Servicios

- SERVICIOS OBLIGATORIOS NO COMERCIALES (niveles de servicio)**

El Supervisor de Operaciones “Grupo Promotor Aries”, en su informe mensual describe las observaciones más relevantes realizadas a cada uno de los Servicios prestados por IOP, según su clasificación, asimismo detalla el cálculo del desempeño del servicio según los indicadores de Mejora continua, mismos que se detallan a continuación:

SM Servicio de Mantenimiento	SJ Servicio de Jardinería	SPG Servicio de Provisión y Gestión
125 → Solicitudes	03 → Solicitudes	05 → Solicitudes
74% → Eficiencia	33% → Eficiencia	60% → Eficiencia
67% → Desempeño	50% → Desempeño	78% → Desempeño



- SERVICIOS OBLIGATORIOS COMERCIALES (niveles de servicio)**



Fuente: “Análisis de indicadores de servicios obligatorios no comerciales y comerciales”, contenido en Informe mensual de operación correspondiente al mes de noviembre de 2025 generado por el Supervisor de Operaciones Grupo Promotor Aries.

- Manuales de Operación y documentación operativa**

Según información proporcionada por el Supervisor de Operaciones, Grupo Promotor Aries, la clasificación de los manuales de operación y documentación operativa del año 2025 es el siguiente:



CLASIFICACIÓN	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN
Rechazado	0	0
Sujeto a Modificación	14	10
Proceder Sujeto a Modificación	5	4
Sin Comentarios	6	14
No presentado	4	1
Total	29	29

Para más información consultar el Doc. [RDC-PCCG-0305-2024](#) en la [plataforma GPA](#)

“Fuente: Tabla resumen del estatus de documentación operativa entregados por el IOP, contenido en Informe mensual de operación correspondiente al mes noviembre de 2025 generado por el Supervisor de Operaciones, Grupo Promotor Aries”.

Nota importante: los datos obtenidos del Informe del Supervisor de Operaciones se mantienen, debido a que, a la fecha de emisión del presente documento, este no ha remitido los informes mensuales de diciembre de 2025, a fecha de elaboración de este informe. La SAPP remitió oficio requiriendo la presentación de estos, para la debida actualización de la información.

r. Actividades relevantes realizadas por el Concesionario en este periodo

Las Actividades de Mantenimiento que realiza el Operador son las siguientes:

- Mantenimiento: Infraestructura e Instalaciones propias del Predio y Equipos Generales y Específicos.
- Jardinería y Control de Fauna Nociva y Extinción de Insectos.
- Provisión y Gestión de Servicios Públicos y Ahorro y uso eficiente de Energía y otros Recursos.
- Telecomunicaciones e Informática, CCTV (circuito cerrado de televisión)
- Seguridad y Vigilancia
- Limpieza Integral y Gestión de Residuos
- Primeros Auxilios
- Estacionamiento a funcionarios sin cobro.
- Estacionamiento a funcionarios con cobro.
- Estacionamiento a Visitas
- Locales Comerciales dentro de los edificios del CCG (Cafeterías, máquinas expendedoras y tiendas de conveniencia).

s. Fuerza laboral actual

Actualmente el Centro Cívico Gubernamental cuenta con aproximadamente 315 personas en su etapa de operación y mantenimiento.

4. VISITAS MENSUALES DE SUPERVISIÓN:

Como parte de las labores de supervisión que realiza esta Gerencia Técnica, con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Inversionista Operador Privado durante la etapa de prestación de los servicios para Centro Cívico, el 26 junio de 2026, se realizó recorrido de supervisión de la operación de las actividades de mantenimiento y operación que el Inversionista Operador Privado está obligado a ejecutar en CCG. En dicha inspección se identificaron los hallazgos descritos en la presente sección.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:


TEMA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES

1. TORRE 2



- Durante la inspección se constató que las cuatro (4) unidades del núcleo de ascensores identificadas con nomenclatura E,F,G y H de la torre 2 se encontraban operando correctamente.



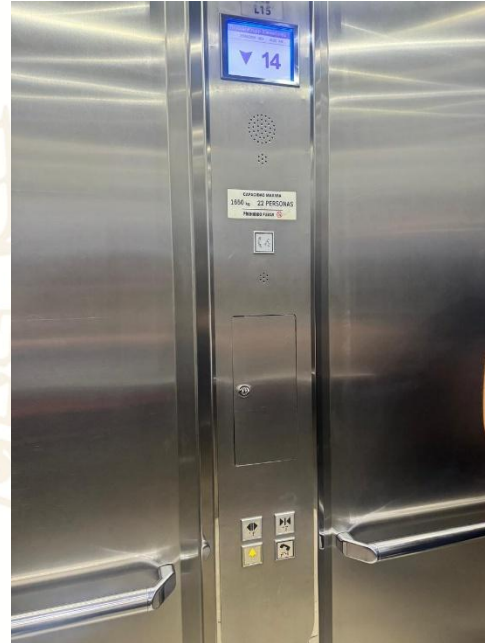

- Se realizarán pruebas de funcionamiento de las botoneras correspondientes a las cuatro (4) unidades del núcleo de elevadores identificadas con la nomenclatura E,F,G y H, verificandose su correcta operación.



- Durante la inspección se constato que las cabinas de elevadores con nomenclatura E,F,G, y H presentan deterioro en las etiquetas que contiene los pasos a seguir en caso de emergencia por atrapamiento en elevadores, así como, las etiquetas de inventario de elevadores.



- Se constató que los teléfonos de emergencia para casos de atrapamiento se encuentran ubicados junto a las puertas de acceso a los elevadores, en el nivel de lobby, en lugar de estar próximos al personal encargado de su atención y seguimiento, lo que podría retrasar la recepción de las alertas y la coordinación de las acciones necesarias para la atención oportuna de personas atrapadas.

TEMA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES

2. LOBBY TORRE 1



Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental “José Cecilio del Valle” Torre 2, nivel 23. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

- Durante la inspección se constató que las cuatro (4) unidades del núcleo de ascensores identificadas con nomenclatura M, N, O y P de la torre 1 se encontraban operando correctamente.



- Durante la inspección se constató que las cabinas de elevadores con nomenclatura M, N, O y P presentan deterioro en las etiquetas que contiene los pasos a seguir en caso de emergencia por atrapamiento en elevadores, así como, las etiquetas de inventario de elevadores.



- Durante la inspección se constató que las cuatro (4) unidades del núcleo de ascensores identificadas con nomenclatura I, J, K, y L de la torre 1 se encontraban operando correctamente.





- Se constató que los teléfonos de emergencia para casos de atrapamiento se encuentran ubicados junto a las puertas de acceso a los elevadores, en el nivel de lobby, en lugar de estar próximos al personal encargado de su atención y seguimiento, lo que podría retrasar la recepción de las alertas y la coordinación de las acciones necesarias para la atención oportuna de personas atrapadas.



- Se realizarán pruebas de funcionamiento de las botoneras de las ocho (8) unidades correspondientes a ambos núcleos de elevadores de la Torre 1, identificadas con la nomenclatura I, J, K, L y M, N, O y P,

constatándose su correcto funcionamiento; no obstante, en el elevador K se verificó que el botón de llamada de emergencia presentaba una falla, al no responder durante las pruebas efectuadas.

a. COMENTARIOS RELEVANTES:

- Se constató que el botón de llamada de emergencias del elevador K del edificio de Torre 1, no se encuentra en funcionamiento, lo que limita la capacidad de los usuarios para solicitar asistencia en caso de alguna eventualidad esto, podría afectar la atención oportuna de incidentes por atrapamiento en elevadores.
- Se constató que los teléfonos de emergencia para casos de atrapamiento en elevadores se encuentran instalados en las inmediaciones de los accesos a los elevadores del nivel de lobby de cada Torre, y no próximos al personal responsable de atender ese tipo de incidentes, lo que podría ocasionar una respuesta tardía en la atención de llamadas de emergencia.
- Se observó deterioro en las etiquetas de información de pasos a seguir en caso de emergencia por atrapamiento en elevadores, dificultando su adecuada identificación.

5. DETALLE DE GARANTÍAS/ FIANZAS:


6. Entidad bancaria	Emitida a favor de	Vigencia	Monto	Observaciones
ASSA Compañía de Seguros Honduras, S.A. Fianza de Cumplimiento No. 85B21 (etapa de construcción)	Banco LAFISE (Honduras), S.A.	15/06/2025 al 15/06/2026	US\$2,139,527.46	-----
ASSA Compañía de Seguros Honduras, S.A. Fianza de Cumplimiento No. 85B10 (etapa de prestación de los servicios)	Banco LAFISE (Honduras), S.A.	15/12/2024 al 15/12/2025	US\$2,356,345.22	-----

6. DETALLE DE PÓLIZAS DE SEGUROS:

Tipo de Póliza	No. de Póliza	Vigencia	Asegurado	Monto	Observaciones
Responsabilidad Civil	No. RESP-1001001247	15/11/2025 al 15/11/2026	Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras, S.A. de C.V.	US\$ 10,000,000.00	
Todo Riesgo	No. TDIN-1001000862	15/11/2025 al 15/11/2026	Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras, S.A. de C.V.	US\$ 208,151,189.31	

7. IMAGENES DE PROYECTO

IMÁGENES AÉREAS DEL PROYECTO

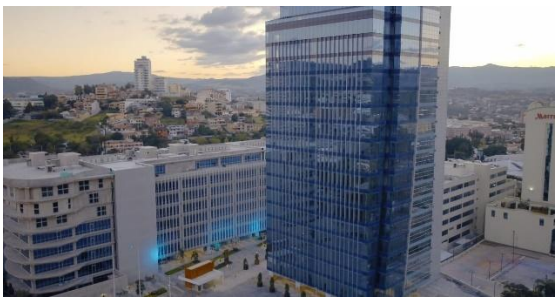

IMÁGENES DE LAS UNIDADES FUNCIONALES QUE CONFORMAN EL CCG




Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental “José Cecilio del Valle” Torre 2, nivel 23. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★



SAPP
SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

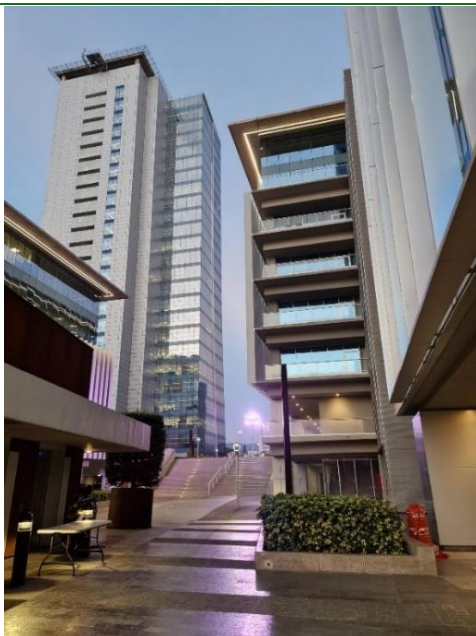

Elaborado por:

Arq. Perla Castro
Analista Técnico

Revisado por:

Arq. Sandra Patricia Urquía
Jefe Técnico

Ing. Miguel Servellón
Gerente Técnico

cc. Archivo

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental “José Cecilio del Valle” Torre 2, nivel 23. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



+(504) 2242-7830



notificaciones@sapp.gob.hn



www.sapp.gob.hn
