2026

OCTUBRE



LA LIMA

"MI CIUDAD ESTA EN DESARROLLO"

INFORME MENSUAL

GERENCIA TÉCNICA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SAPP SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

INFORME DE PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026
GERENCIA TÉCNICA

PERIODO DEL INFORME: Al 31 de octubre de 2026.

NOMBRE DEL PROYECTO: Contrato de Diseño, Financiamiento, Construcción, Mantenimiento y Transferencia de Obras Públicas de Infraestructura Vial. "La Lima, Mi Ciudad Está en Desarrollo"
Concedente: Municipalidad de La Lima
Concesionario: Consorcio MILENIO
Monto Global del Contrato: L.70,993,205.10
Fecha de firma de Contrato de Fideicomiso: 25 de enero de 2013
Empresa Supervisora: SAYBE Y ASOCIADOS
Fecha de firma de Contrato del Proyecto 02 de marzo de 2017
Plazo de Concesión: 16 años
Decreto Ejecutivo: PCM- 005-2014, con fecha 10 de marzo de 2014, aprobación del contrato de Fideicomiso
Plazo de Fideicomiso: 30 años
Decreto Legislativo: Decreto Legislativo No. 62-2015
Decreto Legislativo del Fideicomiso: No 369-2013
Fecha de Acreditación del Cierre Financiero: 20 de julio de 2017
Monto de Acreditación del Cierre Financiero: L 68,693,894.32
Fecha de Inicio de Obras: 18 de agosto de 2017
Fecha de Finalización de Obras: 22 de marzo 2018
Fecha de Inicio del Mantenimiento: 23 de marzo de 2018
Fecha de Finalización Mantenimiento: 23 de marzo 2033
Finalización de la Concesión: 23 de marzo 2033
Modificaciones de Contrato: Adenda No 1, firmada el 24 de enero de 2018
Modificaciones a las Cláusulas:

- Cláusula I – Objeto del Contrato
- Cláusula III – Eventos a la fecha de suscripción y aprobación del Contrato
- Cláusula VII – Del mantenimiento
- Cláusula IX – Régimen económico financiero
- Anexo I – Procedimientos para la explotación y para el control de la gestión del Concesionario

Fiduciario: BANCO FINANCIERA COMERCIAL DE HONDURAS. (FICOHSA).

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" Torre 2, nivel 23. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
www.sapp.gob.hn

1. ETAPA DE INICIO

a. PROYECTO EJECUTIVO

Las obras fueron ejecutadas mediante el Contrato de Diseño, Financiamiento, Construcción, Mantenimiento y Transferencia de Obras Públicas de Infraestructura Vial, suscrito entre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), Banca Financiera Comercial Hondureña, S.A. (BANCO FICOHSA) y el CONSORCIO MILENIO S.A. de C.V. El proyecto consiste en 6.317 km de calles, que fueron pavimentadas, distribuidos en varios tramos dentro de los límites urbanos de la ciudad de La Lima.

En fecha veintitrés (23) de junio de dos mil quince (2015), el Congreso Nacional, mediante Decreto Legislativo No. 62-2015 (publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" número 33,815 de fecha 22 de agosto de 2015), autorizó a la Municipalidad de La Lima a incorporar al patrimonio del Fideicomiso denominado "Ejecución de Obras de Infraestructura y Servicios Públicos en la República de Honduras" (Decreto Legislativo No. 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014), decreto que autoriza la utilización de los fondos municipales provenientes del veinte por ciento (20%) de ingresos de la estación de Peaje de la Municipalidad de San Pedro Sula, la cual ha dejado de ser operativa desde los sucesos vandálicos pos-electorales de noviembre de 2017. Se agregan a estos ingresos los valores que recibe como producto de impuestos y tasas municipales generados en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales; siendo autorizadas tales incorporaciones por la Corporación Municipal de La Lima mediante Acta número 027/14 del dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2014).

Ubicación General del Proyecto:



Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" Torre 2, nivel 23. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
www.sapp.gob.hn

b. CIERRE FINANCIERO

Cierre Financiero fue acreditado satisfactoriamente por El Concesionario y ejecutado totalmente en su fase de construcción:

- **Fecha de Acreditación del Cierre Financiero:** 20 de julio de 2017
- **Monto de Acreditación del Cierre Financiero:** L 68,693,894.32

MONTOS DE INVERSION REFERENCIALES POR AÑO:

TRAMO	MONTO INVERTIDO	% MONTO INVERTIDO
Total Calle A-1	8.155.167,51	100%
Total Calle A-2	1.758.569,88	100%
Total Calle A-3	2.308.075,43	100%
Total Calle A-4	7.053.739,53	100%
Total Calle A-5	2.758.711,44	100%
Total Calle A-6	4.825.316,44	100%
Total Calle A-7	5.152.639,91	100%
Total Calle A-8	9.784.511,55	100%
Total Calle A-9	6.142.769,08	100%
Total Calle A-10	1.076.302,31	100%
Total Calle A-11	3.246.622,93	100%
Total Calle A-12	3.687.796,89	100%
Total Calle A-13	6.127.421,36	100%
SUB-TOTAL	62.077.644,26	100%
Costos pre-opetativos	8,839667.19	
TOTAL	**L 70,917,311.45**	

"Fuente: Datos brindados por parte del Concesionario e Informe de Rendición de Cuentas¨

c. ORDEN DE INICIO

La orden de inicio de las obras fue emitida mediante oficio No. **FI-0433/2017** de fecha 28 de agosto de 2017.

d. PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

Permiso de construcción de fecha de 18 de agosto de 2018.

e. LICENCIA AMBIENTAL

Licencia ambiental No. 1000828 de fecha 23 de marzo de 2017.

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" Torre 2, nivel 23. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
www.sapp.gob.hn

f. DETALLE DE ESTADO DE AVANCE POR OBRA

Las 13 calles fueron construidas en 07 meses, finalizando en el 22 de marzo del año 2018.

2. ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRAS

g. ANTECEDENTES:

Con una inversión referencial de **L 70,917,311.45** (setenta millones novecientos diecisiete mil trecientos once con 45/100 lempiras)

Fuente: Modelo Económico

El Consorcio Milenio S.A. de C.V. ejecutó la construcción de 13 calles que incluyen los estudios, diseños, administración, supervisión y mantenimiento de obras.
Las obras de construcción consistieron en la pavimentación con concreto hidráulico de 13 calles, localizadas convenientemente en distintas zonas de la ciudad, de manera que sirven a importantes y concentrados flujos de usuarios. Estas obras incluyen bordillos, drenajes, aceras, y señalización vertical y horizontal.
Se inicio la construcción de las Obras el 18 de agosto de 2017 y finalizaron el 22 de marzo de 2018
Las calles que fueron pavimentadas se detallan a continuación:

No	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (ml)	% EJECUTADO
1	Pavimentación libramiento de equipo pesado Texaco-Cementerio A.1	746.00	100
2	Pavimentación de conector paso de libramiento salida principal A.2	148.00	100
3	Pavimentación calle campo de futbol la Cusuca, La Paz A.3	215.00	100
4	Pavimentación calle Esc. Manuel Jesús Valencia Col. La Paz A.4	714.00	100
5	Pavimentación calle salida interurbanos Col. La Paz A.5	249.00	100
6	Pavimentación colonia Sula-Centro sector norte A.6	482.40	100
7	Pavimentación colonia Sula-Centro sector sur A.7	504.52	100
8	Boulevard colonia Oro Verde A.8	1050.00	100
9	Pavimentación calle de Sitraterco a La Mesa A.9	655.34	100
10	Conector de obra A.9 con A.10	114.89	100
11	Boulevard Casa de la Cultura A.11	340.20	100
12	Libramiento Chulavista, Los Pinos A.12	394.67	100
13	Pavimentación calles Col. Tela A.13	703.00	100
	Total	6,317.02	100

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" Torre 2, nivel 23. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
www.sapp.gob.hn

h. EN EJECUCIÓN ACTUALMENTE

Todas las obras (13 calles en diferentes colonias) ya fueron ejecutadas en un 100%

i. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA:

No aplica.

j. AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA:

No aplica.

k. AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

La inversión comprometida para este proyecto está en un 100% realizada y ejecutada. Cierre Financiero fue acreditado satisfactoriamente por El Concesionario, y ejecutado totalmente en su fase de construcción.

Monto de Inversión Referencial según definición (29) de la sección (4) del Pliego de Condiciones, setenta millones novecientos noventa y tres mil doscientos cinco con 0/10 **(L.70,993,205.10)**

INVERSION DETALLADA DEL PROYECTO:

Concepto	%	Monto	Observaciones
Construcción de obras		62,046,079.99	(Movimiento de tierra, drenaje, pavimento, señalización y misceláneos-señalización preventiva, gestión de calidad, ambiente e higiene ocupacional, readecuación de áreas verdes e imprevistos).
Administración:			
Gastos Generales	3%	1,861,382.40	Del total de construcción de obras
Permisos	1%	620,460.80	Del total de construcción de obras
Ingeniería:			
Estudios y diseños	4%	2,839,728.20	Del total del monto referencial del pliego de condiciones
Supervisión de obras	5%	3,549,660.26	Del total del monto referencial del pliego de condiciones
Total		**70,917,311.65**	

Fuente: Modelo económico del proyecto ¨La Lima Mi Ciudad está en Desarrollo¨

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" Torre 2, nivel 23. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
www.sapp.gob.hn

l. RESUMEN DE ESTATUS ACTUAL DE LA CONCESIÓN.

Documentalmente la Superintendencia registra, que las obras que comprenden el proyecto fueron ejecutadas por el Concesionario y que asimismo fueron aceptadas por la Municipalidad en su condición de Concedente mediante Acta de aceptación de Obras emitida el 22 de marzo de 2018, fecha a partir de la cual e Concesionario asumió lo relativo a su conservación y mantenimiento en cumplimiento de la obligación establecida en el Contrato; al respecto se registra que posteriormente la conservación y el mantenimiento de las obras fue suspendida en virtud en que mediante oficio CM-49-2020, el Concesionario en fecha 10 de agosto de 2020, considerando configurada la causal de terminación anticipada de Contrato según su propio criterio, notificó de manera unilateral conjuntamente a la Municipalidad de la Lima y al Fiduciario Banco FICOHSA, la Resolución del Contrato de Concesión.
El tránsito vehicular en el proyecto es de bajo flujo por lo que a pesar de no recibir mantenimientos las calles pueden ser transitadas por los usuarios sin mayor problema.
A la fecha, las condiciones del pavimento en general están en buen estado, se presentan fisuras con grado leve y algunos huecos en las losas de concreto de las diferentes calles, principalmente en la Colonia Sitraterco, es importante que se realicen trabajos de limpieza en los tragantes y cunetas ya que muchas se encuentran obstaculizadas por desperdicios de basura y acumulación de tierra.
Las calles presentan un notable desgaste en algunas losas de concreto, en la señalización horizontal; líneas blancas y amarillas laterales y centrales, en flechas direccionales y desgaste de pintura en bordillos, algunos bordillos están quebrados, faltan vialetas en varios tramos de las obras, también se observa algunas tapaderas de tragantes quebradas.


Las obras solo reciben mantenimientos en algunas ocasiones por la Municipalidad de La Lima y los patronatos de las Colonias.

El 27 de junio del 2025 se envió el oficio **No. SAPP-620-2025** dirigido al señor alcalde del municipio de La Lima, solicitando una reunión de trabajo con todos los entes involucrados en el contrato de “La Lima, Mi ciudad está en Desarrollo” con el fin de gestionar y definir soluciones a la para el estatus de la concesión.

m. FUERZA LABORAL ACTUAL (EMPLEOS GENERADOS EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN)

Desde el año 2017 que se comenzaron los trabajos de ejecución de Obras en La Lima hasta el 2020 se han generado un total de empleos directos de 195, empleos indirectos 75 con un Total de 270 empleos generados.

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental “José Cecilio del Valle” Torre 2, nivel 23. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
www.sapp.gob.hn

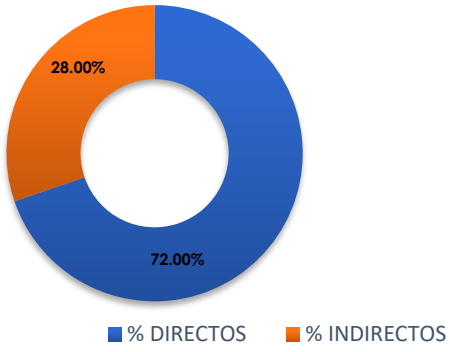

3. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

n. Detalle de Servicios brindados por el Concesionario

Abonos recibidos correspondientes a las cuotas de repago:

Año	(Cuota de repago) Modelo económico del proyecto	Cuota de Repago efectuada por el Fideicomiso	% Pago	Saldo por pagar
2018	13,795,550.76	13,795,550.76	100.00%	0.00
2019	14,071,461.78	3,200.000.00	22.74%	10,871,461.78
2020	14,352,891.01	0.00	0.00%	14,352,891.01
2021	14,639,948.83	0.00	0.00%	14,639,948.83
2022	14,932,747.81	0.00	0.00%	14,932,747.81
2023	15,231,402.76	0.00	0.00%	15,231,402.76
2024	15,536,030.82	0.00	0.00%	15,536,030.82
TOTAL	**102,560,033.77**	**16,995,550.76**		**85,564,483.01**

Fuente: Ingresos obtenidos del Modelo Económico Financiero del proyecto.

No se cuenta con un Supervisor contratado para esta etapa, dado que las actividades de mantenimiento se limitan más que todo a limpieza. Sin embargo, después de transcurrido todo este tiempo después de finalizadas las obras en 2018, y la falta de mantenimientos desde julio 2020 ha provocado que las calles comiencen a presentar deterioro que necesitan ser subsanados y tal como lo manda el Contrato la SAPP se encarga de las inspecciones de manera mensual, mediante las giras programadas con el fin de verificar el estado actual de las obras.

En vista que el Proyecto fue pavimentado con concreto hidráulico, el cual ofrece una superficie de alta resistencia y durabilidad; hasta ahora se han encontrado huecos pequeños, fisuras leves, desgaste en algunas calzadas, desgaste en la pintura de la señalización horizontal, falta de vialetas y drenajes y cunetas azolvadas y con basura.

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" Torre 2, nivel 23. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
www.sapp.gob.hn

A la fecha las obras no están bajo un plan de mantenimiento rutinario y periódico, por el estatus en el que se encuentra la Concesión de un proceso de terminación anticipada de Contrato.

o. EMISIÓN DE PERMISOS EMITIDOS POR EL CONCEDENTE

ACTA	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
ACTA DE ACEPTACION Y RECEPCION DE OBRAS	**Construcción de 13 calles, longitud 6,317.02 km, de acuerdo con la cláusula No VI del Contrato de Concesión**	Extendida por La Alcaldía Municipal de La Lima el 22 marzo de 2018, en su condición de Concedente.

p. DETALLE DE CONTRAPRESTACIÓN/ REPAGO / RETRIBUCIÓN

Las calles construidas por el Concesionario se encuentran en total operación, es decir, disponibles para todos los usuarios y beneficiarios sin restricciones ni obstrucciones de ninguna naturaleza, sin cobro de peajes ni ningún otro tipo de gravamen.

q. INFORMACIÓN SOBRE NIVELES DE SERVICIO, PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO.

Las obras no tienen mantenimiento desde julio de 2020, por lo que no hay un programa de manteniendo que este en vigencia.

r. ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS POR EL CONCESIONARIO EN ESTE PERIODO.

Desde el mes de julio de 2020, el Concesionario no ha realizado ninguna actividad para la conservación y mantenimiento de las obras.

s. FUERZA LABORAL ACTUAL.

No aplica.

4. VISITA MENSUAL DE SUPERVISIÓN:

Se realizó visita de Campo con equipo técnico de la SAPP, para revisión de las condiciones en las que se encuentran las calles de Concreto hidráulico, localizadas en la Col. Libramiento Texaco, Col. La Paz y Col. Sula Centro.

Los trabajos de supervisión fueron realizados por el equipo de la SAPP, en dicha supervisión se revisó el pavimento de concreto hidráulico, bordillos, drenajes, canales, aceras, señalización horizontal y vertical y verificar si se presentaron nuevos hallazgos. Es importante mencionar que no se observan en su mayoría daños considerables en la

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" Torre 2, nivel 23. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
www.sapp.gob.hn

infraestructura vial realizada en toda la pavimentación con concreto hidráulico, las losas del pavimento presentan desgaste, en la algunas colonias es más notorio el desgaste en las calzadas y en varias zonas se comienzan a formar huecos en las losas de concreto, fisuras de menor escala, desgaste en la señalización horizontal , si se observa el desprendimiento del material epóxico utilizado en las juntas de las pastillas de concreto en casi todas las obras y algunos daños en las tapaderas de los tragantes, también algunos bordillos quebrados.

Se identificó desgaste en la pintura de la señalización horizontal en la mayoría de las calles; líneas blancas y amarillas laterales y centrales, en las flechas direccionales, en la pintura de los bordillos, también se observó que faltan vialetas en la mayoría de las obras revisadas.

MAPA DE UBICACION:



SIMBOLOGIA:

Obras recorridas.

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" Torre 2, nivel 23. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
www.sapp.gob.hn

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE SUPERVISION EN CAMPO:

	
Pavimentación libramiento de equipo pesado Texaco-cementerio A.1	Pavimentación conectora paso de libramiento Salida principal A.2.
	
Pavimentación calle campo de fútbol la Cusuca, La Paz A.3	Pavimentación calle Esc. Manuel Jesús Valencia Col. La Paz A.4

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" Torre 2, nivel 23. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
www.sapp.gob.hn

	
Pavimentación Colonia Sula-Centro sector Norte. A.6	Pavimentación Colonia Sula-Centro sector Sur. A.7

5. DETALLE DE GARANTÍAS FINANZAS:

DESCRIPCIÓN	Entidad Bancaria	Vigencia	Monto	Observaciones
Garantía de fiel cumplimiento etapa de Mantenimiento	Banco Ficohsa	30/05/2020 al 30/05/2021	L. 3,549,660.26	No se renovó por el proceso de terminación anticipada del contrato
Garantía Bancaría para la Calidad de Mantenimiento Anual	Banco Ficohsa	22/03/2020 al 22/03/2021	L. 77, 437.55	No se renovó por el proceso de terminación anticipada del contrato

6. DETALLE DE PÓLIZAS DE SEGUROS:

Tipo de Póliza	No. de Póliza	Vigencia	Entidad Bancaria	Monto	Observaciones
Póliza de seguro de obra civil terminada.	OBRA-2001000012 Renovación. 118821700	22/06/2021 Hasta 22/06/2022	Banco Ficohsa	L. 44,416,610.66	No se renovó por el proceso de terminación anticipada del contrato
Póliza de seguro de responsabilidad civil.	RESP 2001001100	22/06/2021 Hasta 22/06/2022	Banco Ficohsa	L. 5,000,000.00	No se renovó por el proceso de terminación anticipada del contrato

7. COMENTARIOS:

a. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR:

La Concesión no tiene actividad para la conservación y mantenimientos de las obras por parte del Concesionario desde julio de 2020 por lo que no está bajo supervisión.

Los trabajos de limpieza los organizan los patronatos de las colonias y esporádicamente reciben el apoyo de cuadrillas de limpieza de la Municipalidad.

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" Torre 2, nivel 23. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
www.sapp.gob.hn

b. COMENTARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA (SAPP):

En seguimiento a nuestras responsabilidades reguladoras y de supervisión se realizó visita de Campo con el equipo técnico de la SAPP, para el reconocimiento de las obras y revisión de las condiciones en las que se encuentran las calles de Concreto hidráulico, localizadas en la Col. Libramiento Texaco, Col. La Paz y Col. Sula Centro.
Los trabajos de supervisión fueron realizados por el equipo de la SAPP, en dicha supervisión además se verificó el estado de los bordillos, drenajes, canales, aceras, señalización horizontal y vertical.

A pesar de que la Concesión actualmente no está bajo mantenimiento rutinario y ni periódico las calles se encuentran en condiciones favorables para el tránsito de los usuarios en las colonias, pero ya se comienza a ver deterioro en las calzadas de concreto hidráulico, desgaste en la señalización horizontal y en algunas losas de concreto son de las áreas más afectadas por la falta de mantenimiento.
Como ente regulador se están realizando mensualmente, supervisiones de campo y se enviaron notificaciones dirigidas a la Municipalidad de La Lima para que puedan darle el mantenimiento óptimo al proyecto, misma que ha estado realizando gestiones internas para poder buscar una solución al problema de la falta de mantenimiento en las obras.

Es importante mencionar que el 27 de noviembre de 2024 el equipo técnico de la SAPP sostuvo una reunión con las máximas Autoridades de la Municipalidad de La Lima con el fin de darle seguimiento al estado actual de la Concesión y poder encontrar las posibles soluciones para que se puedan cumplir las responsabilidades contractuales que les corresponden en su figura de Concedente.

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" Torre 2, nivel 23. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
www.sapp.gob.hn

8. IMAGENES DE PROYECTO:

GERENCIA TÉCNICA
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP)

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" Torre 2, nivel 23. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
www.sapp.gob.hn
